Ylöjärven kaupunki
Toimitilat

Talonrakennus 2023

Investointiohjelma

	Hier	Nimi	Vastuuhenkilö	Budj.yht.	Budj.2023	Kesto	Aik. alku	Aik. loppu
1	-1	KOULUINVESTOINNIT		35 520 000	13 500 000	1115 pv	01.03.21	31.07.25
2	- 1.1	Siltatien koulu, vaiheet 1 ja 2	Hannu/Sitowise	18 270 000	7 500 000	740 pv	01.03.21	31.01.24
3	1.1.1	Rakennusaika, vaihe 1				337 pv	01.03.22	30.06.23
4	1.1.2	Käyttäjän kalusteet				35 pv	03.07.23	18.08.23
5	1.1.3	Koulun aloitus				1 pv	08.08.23	08.08.23
6	1.1.4	Rakennusaika, vaihe 2				740 pv	01.03.21	31.01.24
7	- 1.2	Ylöjärven Yhtenäiskoulu (tekla)	Hannu	400 000		233 pv	02.01.23	30.11.23
8	1.2.1	Väistötilat				233 pv	02.01.23	30.11.23
9	1.2.2	Korjaustyöt, C-osa, 1.- 2.krs.				97 pv	16.01.23	05.06.23
10	1.2.3	Korjaus- ja muutostyöt, C-osa 1.krs VET-tilat normaalikä				109 pv	12.06.23	10.11.23
11	- 1.3	Soppeenharjun Yläkoulun laajennus ja saneeraus	Hannu/Sitowise	12 350 000	3 000 000	454 pv	01.09.22	19.06.24
12	1.3.1	Laajennuksen hankesuunnittelu				109 pv	01.09.22	03.02.23
13	1.3.2	Kvr-urakan kilpailutus				56 pv	08.02.23	28.04.23
14	1.3.3	Kvr- urakoitsijan valinta				1 pv	10.05.23	10.05.23
15	1.3.4	kvr-urakoitsijan suunnittelu				143 pv	29.05.23	15.12.23
16	1.3.5	Rakentaminen				215 pv	14.08.23	19.06.24
17	1.3.6	Saneerauksen hankesuunnittelu				264 pv	17.10.22	31.10.23
18	- 1.4	Kurun yhtenäiskoulu		2 250 000	1 500 000	644 pv	09.01.23	31.07.25
19	1.4.1	Väistötilat				644 pv	09.01.23	31.07.25
20	1.4.2	Uuden yhtenäiskoulun hankesuunnittelu				148 pv	01.03.23	29.09.23
21	- 1.5	Karhen koulu		2 250 000	1 500 000	1 pv	10.12.21	10.12.21
22	1.5.1	Valitus purkuluvasta hallinto-oikeudessa				1 pv	10.12.21	10.12.21
23	- 2	Päiväkoti-investoinnit				494 pv	12.08.22	26.07.24
24	- 2.1	Serlapuiston päiväkodin lisärakennus	Esa V			105 pv	06.09.22	02.02.23
25	2.1.1	Maarakennus- ja perustustyöt				84 pv	06.09.22	03.01.23
26	2.1.2	Tilaelementtien asennus				2 pv	04.01.23	05.01.23
27	2.1.3	Viimeistelytyöt				14 pv	09.01.23	26.01.23
28	2.1.4	Luovutus tilaajalle				1 pv	27.01.23	27.01.23
29	2.1.5	Käyttöönotto				5 pv	27.01.23	02.02.23
30	- 2.2	Soppeenharjun päiväkoti	Esa V/ Sitowise			494 pv	12.08.22	26.07.24
31	2.2.1	Hankesuunnittelu				76 pv	12.08.22	25.11.22
32	2.2.2	Kvr-urakan kilpailutus				41 pv	19.12.22	15.02.23
33	2.2.3	Kvr-urakoitsijan valinta				1 pv	16.03.23	16.03.23
34	2.2.4	Rahoituksen kilpailutus				83 pv	19.09.22	16.01.23
35	2.2.5	Rahoitustarjoukset				1 pv	30.01.23	30.01.23
36	2.2.6	Rahoittajan valinta				1 pv	27.04.23	27.04.23
37	2.2.7	Kvr-urakoitsijan suunnittelu				174 pv	12.04.23	15.12.23
38	2.2.8	Vanhan Saurion päiväkodin purku				21 pv	03.07.23	31.07.23
39	2.2.9	Väistötilat				281 pv	16.06.23	26.07.24
40	2.2.1	Päiväkodin rakentaminen				230 pv	01.08.23	28.06.24
41	- 3	KIINTEISTÖJEN LÄMMITYSTAPAMUUTOKSE		400 000		226 pv	01.11.22	22.09.23
42	- 3.1	Veittijärven koulu (tekla)	Kerttu/ Esa V	400 000		179 pv	10.01.23	22.09.23

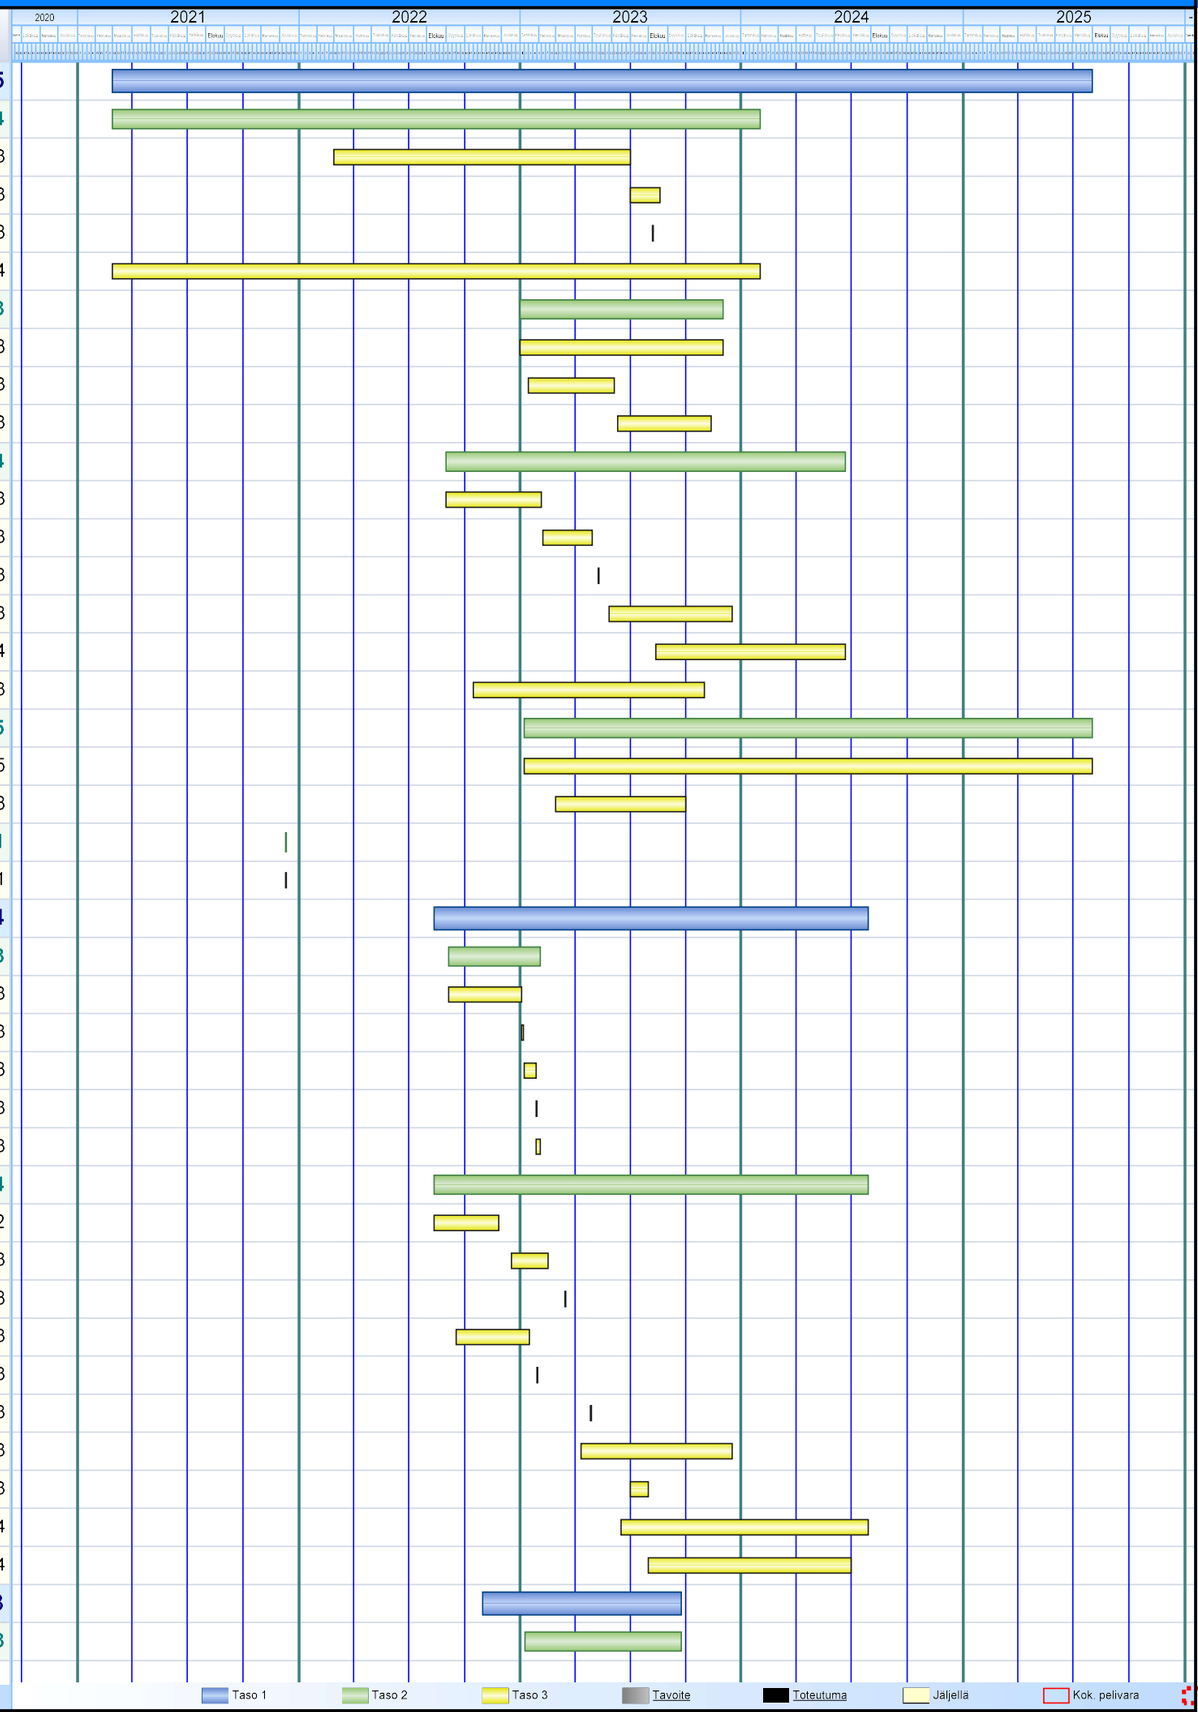

Ylöjärven kaupunki — Talonrakennus 2022 — Investointiohjelma

Toimitilat
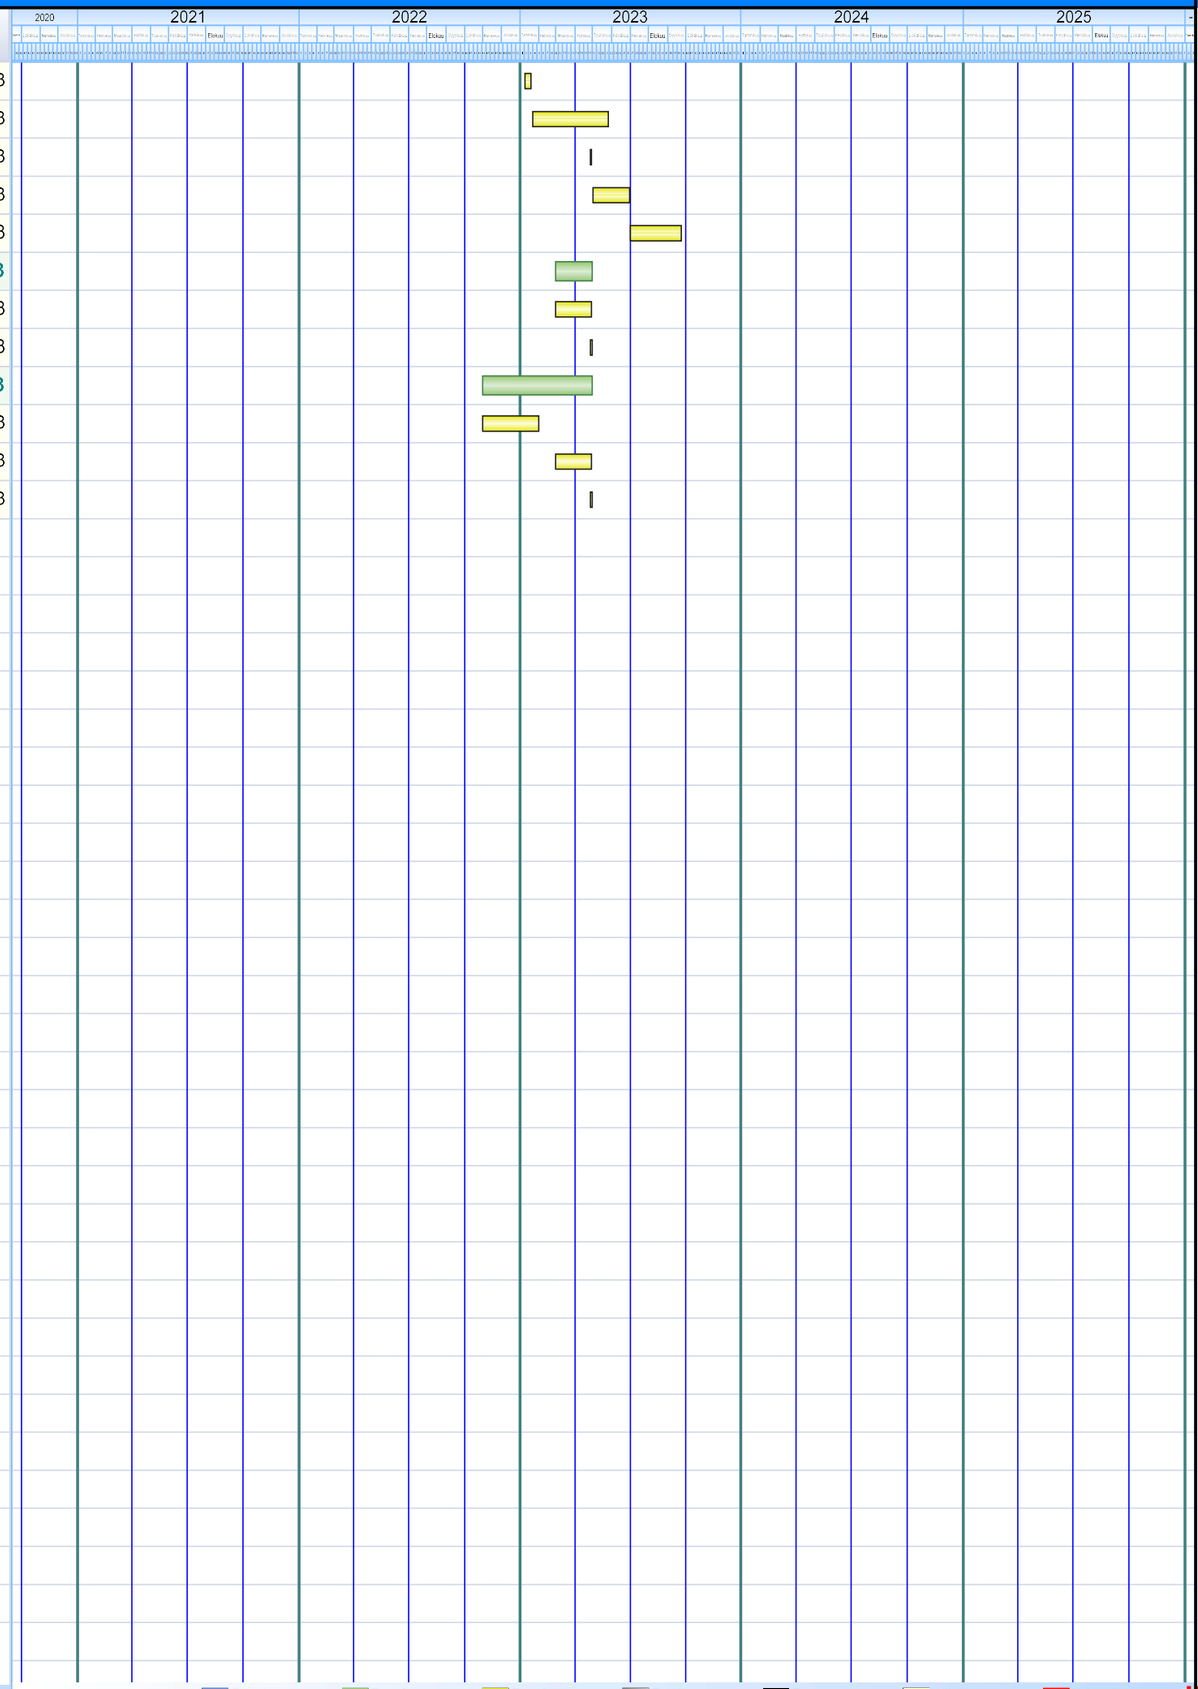
	Hier	Nimi	Vastuuhenkilö	Budj.yht.	Budj.2023	Kesto	Aik. alku	Aik. loppu
43	3.1.1	Päätös maalämmöstä				7 pv	10.01.23	18.01.23
44	3.1.2	Tarjouspyyntö ostoenergiasta				85 pv	23.01.23	25.05.23
45	3.1.3	Lämmöntoimittajan valinta(Tekla)				1 pv	27.04.23	27.04.23
46	3.1.4	Toimittajan toteutussuunnittelu				41 pv	02.05.23	29.06.23
47	3.1.5	Toteutus				60 pv	03.07.23	22.09.23
48	- 3.2	**Viljjakkalan yhtenäiskoulu**	**Kerttu/ Esa V**			**41 pv**	**01.03.23**	**28.04.23**
49	3.2.1	Toteutus				40 pv	01.03.23	27.04.23
50	3.2.2	Pellettilämmityksen käyttöönotto				2 pv	27.04.23	28.04.23
51	- 3.3	**Palvelukeskus Onnimanni**	**Kerttu/ Esa V**			**124 pv**	**01.11.22**	**28.04.23**
52	3.3.1	Suunnittelu toimittajalta				63 pv	01.11.22	31.01.23
53	3.3.2	Toteutus				40 pv	01.03.23	27.04.23
54	3.3.3	Pellettilämmityksen käyttöönotto				2 pv	27.04.23	28.04.23
